

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประดู่ระบายหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประดู่ระบายน้ำที่นางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอวังสะพุง จังหวัดพิษณุโลก	100,000,000.00	97,100,995.00	23,812,000.00	73,288,995.00	46,004,027.06	62.77	46.00	27,284,967.94
2	ประดู่ระบายหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห ตำบลท่าแหงเงิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	66,522,872.00	-	66,522,872.00	41,429,637.31	62.28	59.19	25,093,234.69
3	ค้ำก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	67,545,712.00	-	67,545,712.00	27,809,745.63	41.17	39.73	39,735,966.37
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สัด ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สัด อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	37,784,360.34	75.57	75.57	12,215,639.66
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	81,421,406.00	-	81,421,406.00	61,095,822.53	75.04	484.02	20,325,583.47
6	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร		52,450,900.00	-	52,450,900.00	-	-	-	52,450,900.00
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัด จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	-	-	-	14,814,000.00
8	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการประดู่ระบายน้ำบ้านวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอรังทอง จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	189,834.00	63.28	63.28	110,166.00
9	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเหย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	144,074.60	48.02	48.02	155,925.40
10	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	170,183.30	56.73	56.73	129,816.70
11	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
รวม		318,336,500.00	431,505,885.00	23,812,000.00	407,693,885.00	214,627,684.77	52.64	67.42	193,066,200.23

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนเงินที่เบิก	ค่าร้อยละ		
<b>ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน</b>						
1	โครงการประดู่ระบายน้ำที่นางงาม	1,432,228.00	-	-	-	1,432,228.00
2	โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห	794,572.00	779,400.00	15,172.00	100.00	-
3	โครงการฝายบ้านวังจิก	1,027,840.00	947,600.00	80,240.00	100.00	-
4	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	88,508.00	50,850.00	37,657.52	100.00	0.48
5	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	9,403,158.00	-	-	-	9,403,158.00
รวม		12,746,306.00	1,910,919.52		14.99	10,835,386.48

งบดำเนินงาน	รายการประจำ	งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	
				ระบบ GF	
				จำนวนเงิน	% จัดสรร
1	ค่าสาธารณูปโภค	634,449.04	555,847.86	87.61	
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,675.00	99.35	
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	326,666.68	66.67	
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	35,200.86	35,200.86	100.00	
รวม		1,209,649.90	967,390.40	79.97	
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (0700351701700006)	61,200.00	33,275.00	54.37	
2	งบดำเนินงาน (07003507C000000)	50,000.00	40,600.00	81.20	
รวม		111,200.00	73,875.00	66.43	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Cash Flow) ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-4

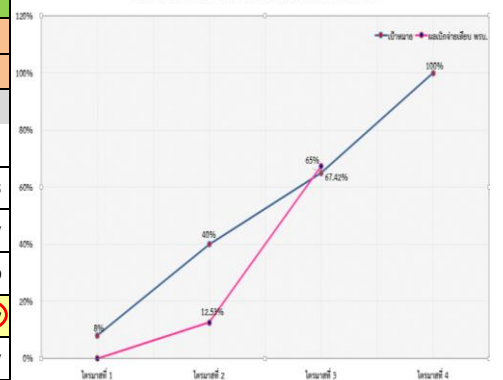

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- งบดำเนินงาน	๘%	๔๐%	๖๕%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำปี	๐%	๑๒.๕%	๖๗.๔๒%	๖๖.๔๓%
- รายจ่ายสะสม	๘%	๕๒.๕%	๘๖.๔๒%	๑๐๐%
