

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประดูระบายน้ำทางและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประดูระบายน้ำทางงาน ตำบลท่านางาม อำเภอวังสะพุง จังหวัดพิษณุโลก	100,000,000.00	97,100,995.00	23,812,000.00	73,288,995.00	46,075,115.06	62.87	46.08	27,213,879.94
2	ประดูระบายน้ำทางและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประดูระบายน้ำท่าแห ตำบลท่าแถม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	66,522,872.00	-	66,522,872.00	41,582,337.31	62.51	59.40	24,940,534.69
3	ก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	67,545,712.00	-	67,545,712.00	29,640,225.63	43.88	42.34	37,905,486.37
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สัด ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สัด อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	38,029,070.34	76.06	76.06	11,970,929.66
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	81,421,406.00	-	81,421,406.00	81,421,406.00	100.00	645.05	-
6	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร		52,450,900.00	-	52,450,900.00	-	-	-	52,450,900.00
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัด จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	-	-	-	14,814,000.00
8	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการประดูระบายน้ำทางวังสะพุงพร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	296,214.00	98.74	98.74	3,786.00
9	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเบา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	144,074.60	48.02	48.02	155,925.40
10	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	190,417.30	63.47	63.47	109,582.70
11	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	750,000.00	-	750,000.00	153,000.00	20.40	-	597,000.00
รวม		318,336,500.00	431,505,885.00	23,812,000.00	407,693,885.00	237,531,860.24	58.26	74.62	170,162,024.76

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			ค่าเงินคืนที่ดิน	ค่าร้อยละ		
ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน						
1	โครงการประดูระบายน้ำทางงาน	1,432,228.00	1,294,681.00	137,547.00	100.00	-
2	โครงการประดูระบายน้ำท่าแห	794,572.00	779,400.00	15,172.00	100.00	-
3	โครงการฝายบ้านวังจิก	1,027,840.00	947,600.00	80,240.00	100.00	-
4	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	88,508.00	50,850.00	37,657.52	100.00	0.48
5	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	9,403,158.00	2,293,290.00	1,814,288.92	43.68	5,295,579.08
รวม		12,746,306.00		7,450,726.44	58.45	5,295,579.56

งบดำเนินงาน	งบประมา ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	% จัดสรร
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000			
1	ค่าสาธารณูปโภค	634,449.04	633,754.56 99.89
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,675.00 99.35
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	367,500.02 75.00
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	35,200.86	35,200.86 100.00
รวม		1,209,649.90	1,086,130.44 89.79
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (0700351701700006)	61,200.00	61,175.00 99.96
2	งบดำเนินงาน (07003507C000000)	100,000.00	45,060.00 45.06
รวม		161,200.00	106,235.00 65.90

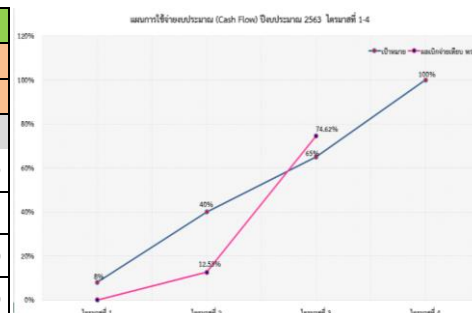

งบประมา ที่ได้รับจัดสรร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๒๓%	๕๔%	๗๓%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำปี	๒๔%	๕๖%	๘๐%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๔%	๔๐%	๖๔%	๑๐๐%
