


รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563
(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประตูประชาชนและอาคารประกอบ ขนาด 12.50 X 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูประชาชนที่ท่านางาม ตำบลท่านางาม อำเภอวังสะพุง จังหวัดพิษณุโลก	100,000,000.00	97,100,995.00	30,332,521.00	66,768,474.00	55,055,511.50	82.46	55.06	11,712,962.50
2	ประตูประชาชนและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 X 9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูประชาชนที่ท่าแห ตำบลท่าแหงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	66,522,872.00	3,311,161.00	63,211,711.00	50,545,318.12	79.96	72.21	12,666,392.88
3	ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000.00	67,545,712.00	2,492,321.00	65,053,391.00	41,279,426.58	63.45	58.97	23,773,964.42
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สัดล ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สัดล อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	47,536,094.12	95.07	95.07	2,463,905.88
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	12,622,500.00	81,421,406.00	-	81,421,406.00	81,421,406.00	100.00	645.05	-
6	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร		52,450,900.00	7,997,043.00	44,453,857.00	-	-	-	44,453,857.00
7	ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัดล จังหวัดตาก	14,814,000.00	14,814,000.00	-	14,814,000.00	-	-	-	14,814,000.00
8	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการประตูประชาชนที่ท่านางามวังสะพุงพร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	3,786.00	296,214.00	296,214.00	98.74	98.74	-
9	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเหย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	300,000.00	300,000.00	377.90	299,622.10	299,622.10	99.87	99.87	-
10	ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	300,000.00	300,000.00	5,582.70	294,417.30	294,417.30	98.14	98.14	-
11	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	750,000.00	20.00	749,980.00	749,980.00	100.00	-	-
รวม		318,336,500.00	431,505,885.00	44,142,812.60	387,363,072.40	277,477,989.72	71.63	87.16	109,885,082.68

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	ผลเบิกจ่าย		%	คงเหลือ
			จำนวนเงินที่คืน	ค่าร้อยละ		
ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน						
1	โครงการประตูประชาชนที่ท่านางาม	1,432,228.00	1,294,681.00	137,547.00	100.00	-
2	โครงการประตูประชาชนที่ท่าแห	794,572.00	779,400.00	15,172.00	100.00	-
3	โครงการฝายบ้านวังจิก	1,027,840.00	947,600.00	80,240.00	100.00	-
4	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล)	88,508.00	50,850.00	37,657.52	100.00	0.48
5	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	9,752,854.00	5,036,635.00	2,216,241.96	74.37	2,499,977.04
รวม		13,096,002.00		10,596,024.48	80.91	2,499,977.52

งบดำเนินงาน	งบประมา ที่ได้รับจัดสรร	ผลเบิกจ่าย		
		จำนวนเงิน	% จัดสรร	
งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000				
1	ค่าสาธารณูปโภค	705,616.47	705,616.47	100.00
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	49,675.00	99.35
3	ค่ารักษาความปลอดภัย	490,000.00	490,000.00	100.00
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	35,200.86	35,200.86	100.00
รวม		1,280,817.33	1,280,492.33	99.99
1	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (0700351701700006)	61,175.00	61,175.00	100.00
2	งบดำเนินงาน (07003507C000000)	100,000.00	90,050.00	90.05
3	งบดำเนินงาน (07003117D1000000)	75,000.00	-	-
รวม		161,175.00	151,225.00	93.83

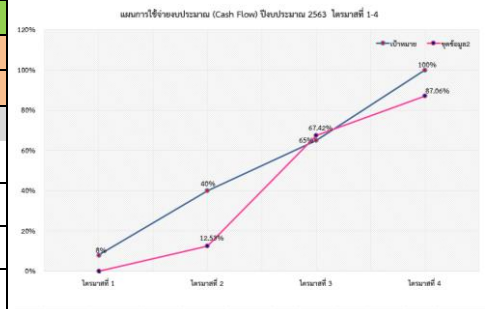

แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๒๓%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำปี	๒๔%	๕๔%	๘๐%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๔%	๔๐%	๖๕%	๑๐๐%
