

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทาน ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	93,505,600.00	14,613,972.00	78,891,628.00	10,874,013.39	13.78	9.06	68,017,614.61
2	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	473,796.00	69,526,204.00	2,385,884.57	3.43	3.41	67,140,319.43
3	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	46,621,098.00	1,436,241.00	45,184,857.00	17,457,414.81	38.64	34.91	27,727,442.19
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 กม โครงการฝายแม่สลด ตำบลแม่สลด อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	100,000,000.00	98,313,100.00	145,758.00	98,167,342.00	75,737,265.95	77.15	75.74	22,430,076.05
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	319,327.10	20.65	20.65	1,226,872.90
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	562,706.55	37.27	37.27	946,993.45
7	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	63,793,300.00	83,793,300.00	-	83,793,300.00	-	-	-	83,793,300.00
8	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	63,112,600.00	73,112,600.00	-	73,112,600.00	25,078,782.69	34.30	39.74	48,033,817.31
9	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	25,182,300.00	64,544,600.00	-	64,544,600.00	14,995,984.29	23.23	59.55	49,548,615.71
<b>รวม</b>		<b>495,144,100.00</b>	<b>532,946,198.00</b>	<b>16,669,767.00</b>	<b>516,276,431.00</b>	<b>147,411,379.35</b>	<b>28.55</b>	<b>29.77</b>	<b>368,865,051.65</b>

เป้าหมายกรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๗๖%	๘๕%	๙๓%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๗๖%	๘๕%	๙๓%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๖๐%	๘๕%	๙๕%	๑๐๐%

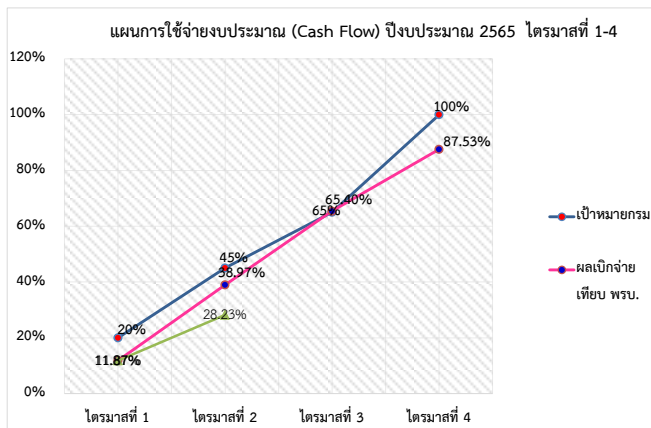

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ CF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ		600,000.00	-	600,000.00	100,224.00	16.70	16.70	499,776.00
1	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	-	300,000.00	-	300,000.00	100,224.00	33.41	-	199,776.00
2	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด จังหวัดอุตรดิตถ์	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ		30,600.00	-	30,600.00	-	-	-	30,600.00
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพริกขิง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองไทย จังหวัดพิจิตร	-	15,300.00	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมด ตำบลหลักขวาง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	-	15,300.00	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		4,300,000.00	-	4,300,000.00	42,500.00	0.99	0.99	4,257,500.00
1	โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแกม จังหวัดพิจิตร	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
2	โครงการประดู่ระบายน้ำบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	-	200,000.00	-	200,000.00	42,500.00	21.25	21.25	157,500.00
3	โครงการประดู่ระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
4	โครงการประดู่ระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
5	แผนงานการฟื้นฟูและจัดภูมิทัศน์บริเวณวังงานประดู่ระบายน้ำเพื่อการท่องเที่ยว	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าเรือขี้นในการจัดหาที่ดินโครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์		7,962,285.00		7,962,285.00	4,195,926.10	52.70	52.70	3,766,358.90
	งบดำเนินงาน (รายการประจำ) 0700351701000000		449,446.16	-	449,446.16	365,778.19	81.38	81.38	83,667.97
1	ค่าสาธารณูปโภค	-	153,168.00	-	153,168.00	151,823.19	99.12		1,344.81
2	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	100,000.00	-	100,000.00	50,621.00	50.62		49,379.00
3	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	-	163,335.00	-	163,335.00	163,334.00	100.00		1.00
4	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ	-	32,943.16	-	32,943.16	-	-		32,943.16
	รวมทั้งสิ้น	-	12,742,331.16	-	12,742,331.16	4,704,428.29	36.92	36.92	8,138,126.87

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	คงเหลือ
1	งบลงทุนก่อสร้าง	516,276,431.00	147,411,379.35	28.55	368,865,051.65
2	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าเรือขี้นในการจัดหาที่ดิน	7,962,285.00	4,195,926.10	52.70	3,766,358.90
3	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม + ค่าปีดงานก่อสร้าง	600,000.00	100,224.00	16.70	499,776.00
4	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,600.00	-	-	30,600.00
5	ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4,300,000.00	42,500.00	0.99	4,257,500.00
6	งบดำเนินงาน	449,446.16	365,778.19	81.38	83,667.97
7	เงินกันเหลือปี 2564	160,477,947.45	103,299,003.74	64.37	57,178,943.71
	รวมทั้งสิ้น	690,096,709.61	255,414,811.38	37.01	434,681,898.23

