




ประตูละบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก



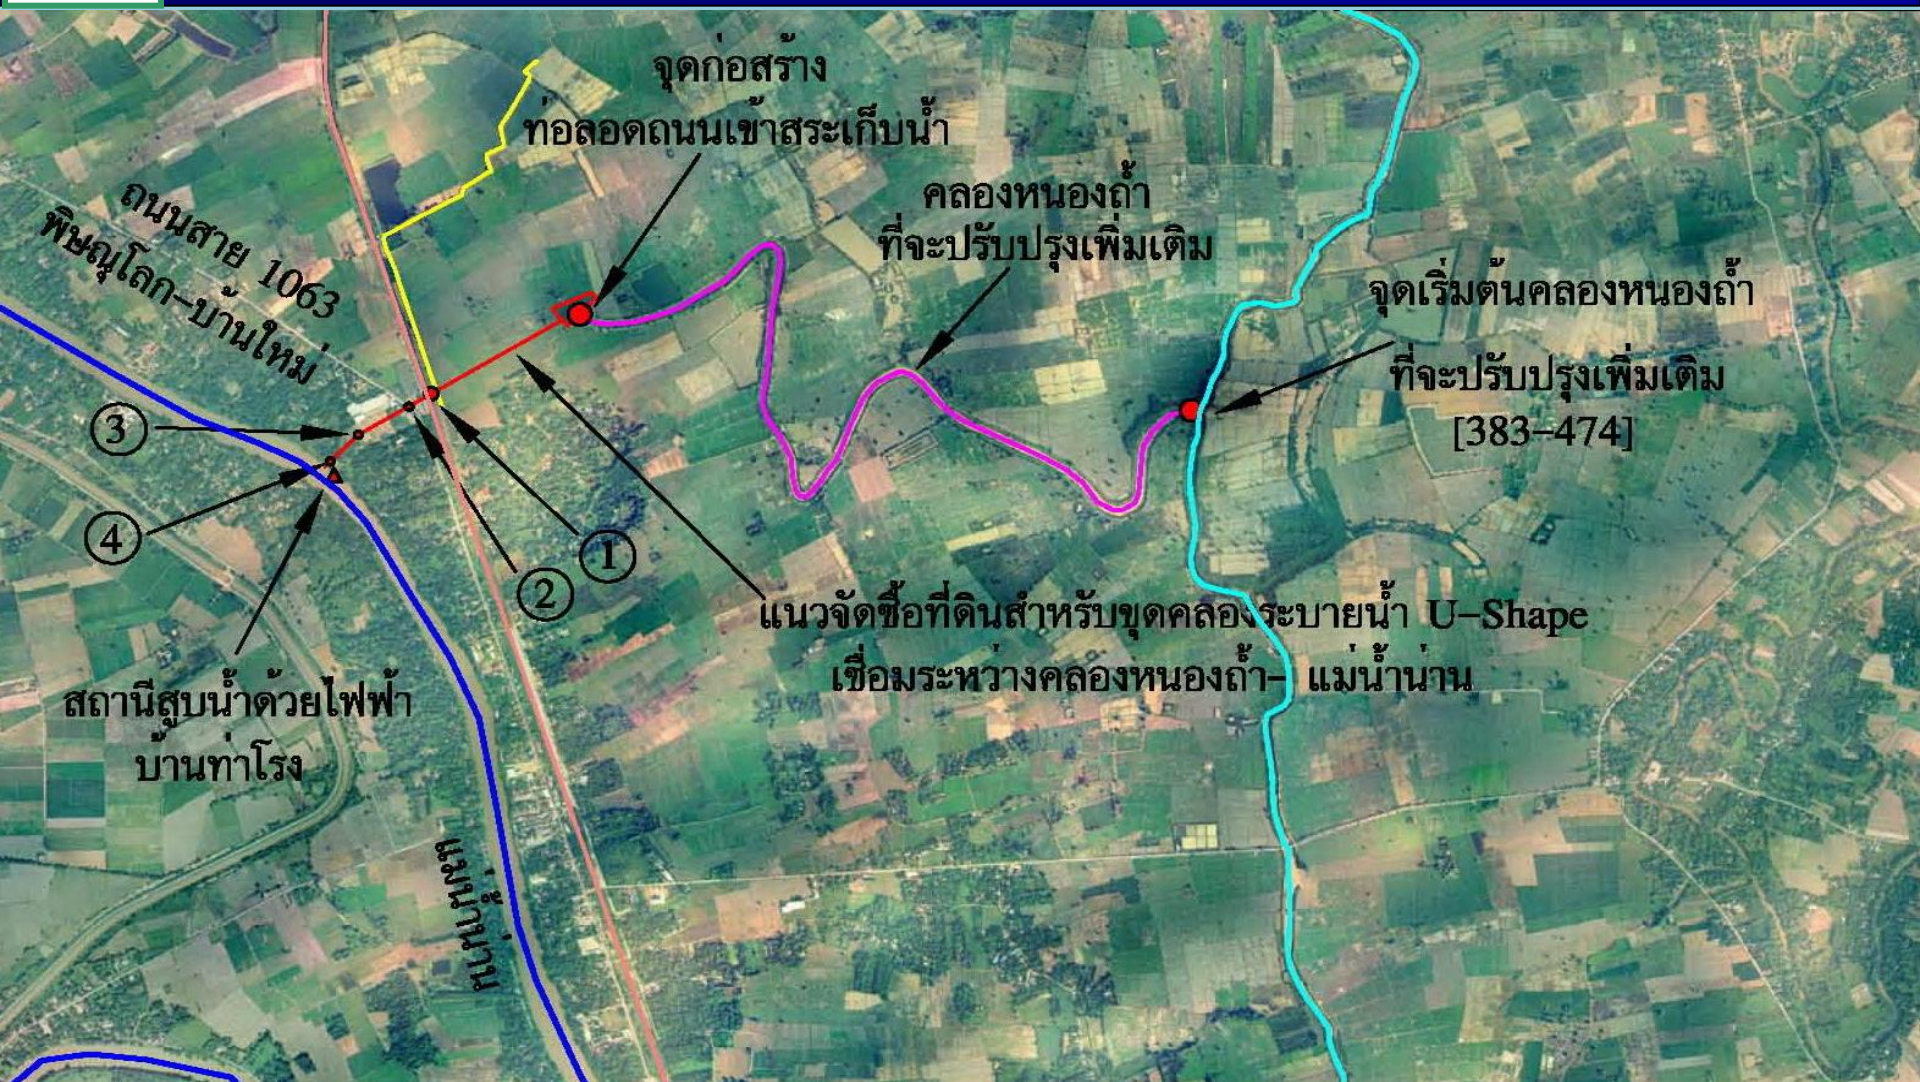

- 1.ROADWAY BRIDGE (6.00 M. WIDTH) กม. 0+903
- 2.อาคารระบายน้ำล้น ค.ส.ล. กม.1+484 ขนาด 5 - 3.00 X 3.00 ม.
- 3.ROADWAY BRIDGE (6.00 M. WIDTH) กม. 2+223
- 4.อาคารระบายน้ำล้น ค.ส.ล. กม.2+775 ขนาด 5 - 3.00 X 3.00 ม.
- 5.ROADWAY BRIDGE (6.00 M. WIDTH) กม. 3+906
- 6.ROADWAY BRIDGE (6.00 M. WIDTH) กม. 4+567
- 7.ทรบ.ปากเหมือง กม. 4+612 ขนาด 1 - 2.00 X 2.00 ม
- 8.ท่อลอด กม. 5+232 ขนาด 5 - 3.60 X 3.60 ม.
- 9.ROADWAY BRIDGE (4.00 M. WIDTH) กม. 5+330
- 10.ROADWAY BRIDGE (6.00 M. WIDTH) กม. 5+381
- 11.U-Shape กว้าง 20 ม.สูง 4 ม. ข้าง กม. 5+300.50 - กม. 5+710
- 12.ประตูระบายน้ำ กม. 5+731.50 ขนาด 3 - 6.00 X 4.00 ม.
- 13.ROADWAY BRIDGE (6.00 M. WIDTH) กม. 5+793
- 14.ขดลอกคลอง กม. 0+050 - กม. 5+204

ในเขตพื้นที่ ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ลดพื้นที่เสียหาย จำนวน 21,362 ไร่

งบประมาณทั้งสิ้น **260,000,000 บาท**


ปีงบประมาณ 2557 = 60,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2558 = 100,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2559 = 100,000,000 บาท



ประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก

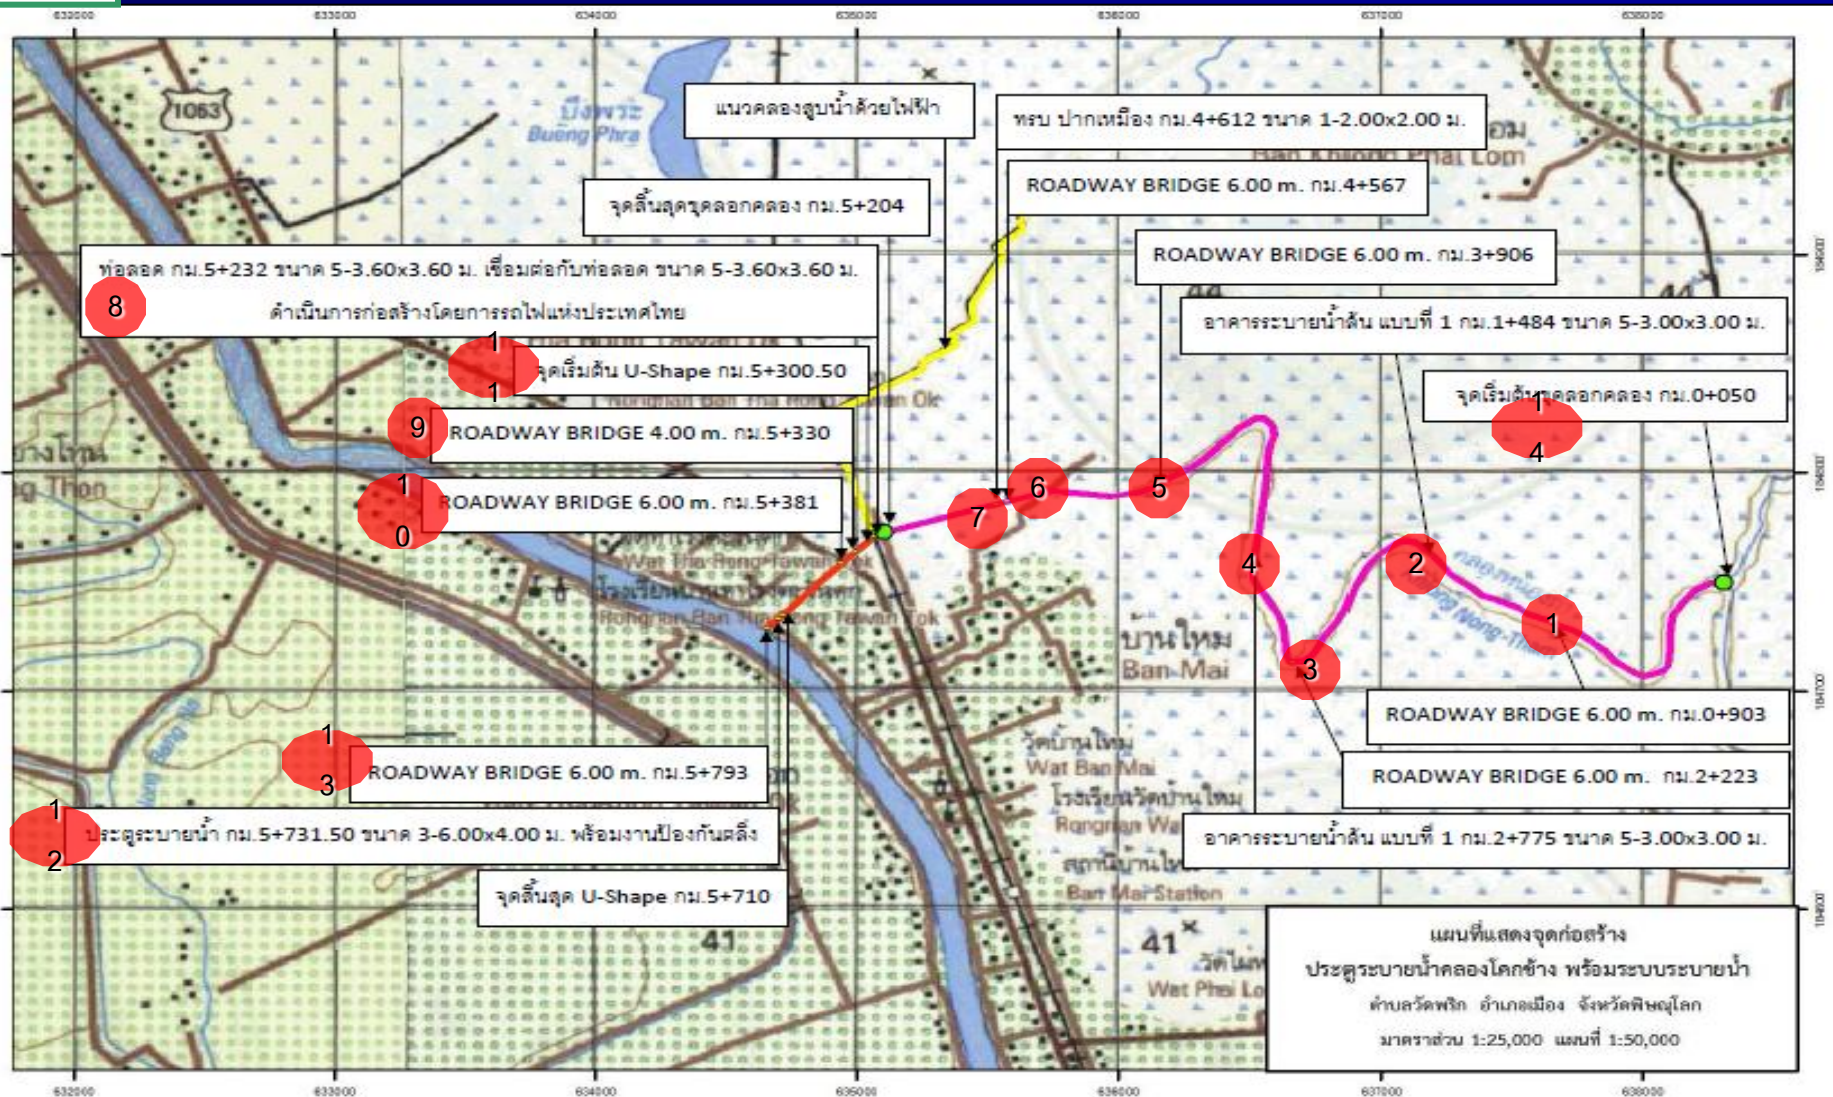



การเตรียมความพร้อมก่อนก่อสร้างโครงการ

- ศึกษาความเหมาะสม สำนักรวจออกแบบ งานออกแบบ
ดำเนินการเสร็จแล้ว
- อนุมัติเปิดโครงการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
- กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (จัดซื้อที่ดินบางส่วน)
- แผนสำรวจปักหลักเขต และรังวัดที่ดิน ปี 2556
- แผนการจัดซื้อที่ดิน จำนวน 14 แปลง
- เวทีประชาคมเพื่อการก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
- การขออนุญาตใช้พื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ



ประตูละบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก

ผลประโยชน์ของโครงการ

- ประตูละบายน้ำขนาด 4.00 x 6.00 ม. พร้อมอาคารประกอบระบบระบายน้ำ คลองกว้างประมาณ 20.00 ม. ลึก 4.00 ม. ความยาว 5,500.00 ม. ลาดท้องคลอง 1:6,000 (ปริมาณการระบายน้ำมากกว่า 90.00 ลบ.ม./วินาที)
- สามารถระบายน้ำจากพื้นที่โครงการชลประทานฝั่งซ้าย ตลอดจนในเขต อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณการระบายน้ำมากกว่า 90.00 ลบ.ม./วินาที และสามารถเก็บน้ำในลำน้ำซึ่งมีความจุประมาณ 598,500 ลูกบาศก์เมตร
- เพิ่มพื้นที่การเกษตรและป้องกันอุทกภัย
- มีน้ำอุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น

